

## BÁO CÁO

**Giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2018**  
**Dự án: Đường giao thông từ QL 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn**  
**và khu công nghiệp phía Đông, TX. Bỉm Sơn.**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

### I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

*(Theo nội dung thông tin tại báo cáo Quý II năm 2017)*

### II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

#### 1. Tình hình thực hiện dự án:

##### 1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

Đảm bảo theo chất lượng, tiến độ chung của dự án đề ra.

##### 1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:

Khối lượng dự án đã thực hiện được khoảng 124 tỷ.

##### 1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:

- Quản lý và sử dụng vốn đúng quy định
- Lũy kế giải ngân của cả dự án: 76.998,6 triệu đồng

##### 1.4. Chất lượng công việc đạt được:

- Phần nền mặt đường đạt 100% khối lượng hợp đồng;
- Phần công trình thoát nước đạt 98% khối lượng hợp đồng;
- Phần an toàn giao thông đạt 80% khối lượng hợp đồng.
- Phần điện chiếu sáng chưa thi công.

##### 1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án:

Chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, chi phí thẩm định hồ sơ đấu thầu, chi phí giám sát thi công xây dựng, chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình, chi phí kiểm toán, chi phí bảo hiểm công trình và các lệ phí khác.

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án: Biến động về chế độ chính sách tiền lương, giá nguyên nhiên vật liệu, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng;

#### 2. Công tác quản lý dự án:

##### 2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện:

Bắt đầu triển khai thực hiện dự án từ năm 2015 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018.

2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án:

- Từ tháng 4/2016 đến tháng 01/2017 thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Từ tháng 6/2016 tổ chức triển khai thi công, đến nay đã đạt được khoảng 95% khối lượng công việc theo hợp đồng.

- Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017: Tổ chức lập dự án bổ sung phần diện chiếu sáng.

- Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018: Thiết kế, thẩm tra và phê duyệt TKBVTC và dự toán hạng mục điện chiếu sáng.

- Tháng 7/2018 đến tháng 8/2018: Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp

- Tháng 9/2018 đến tháng 2/2019: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng.

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu: không điều chỉnh

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: Đảm bảo.

**3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Đảm bảo.**

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo:

Hàng tháng chủ đầu tư tổng hợp các thông tin có liên quan đến quá trình thực hiện đầu tư dự án như: Giá trị khối lượng xây lắp, các chi phí khác, tiến độ thực hiện các hợp đồng tư vấn, những khó khăn, vướng mắc... để thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

3.2. Xử lý thông tin báo cáo:

Sau khi tổng hợp các thông tin có liên quan đến quá trình thực hiện đầu tư dự án, những việc thuộc thẩm quyền kịp thời xử lý, giải quyết, những việc vượt quá thẩm quyền chủ đầu tư báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết nhằm tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án.

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh:

**III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN**

**1. Tình hình thực hiện dự án: Đảm bảo theo kế hoạch.**

**2. Công tác quản lý dự án: Đảm bảo theo quy định.**

**3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Đảm bảo.**

**IV. KIẾN NGHỊ: Không./.**

(Kèm theo phụ lục 07)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; TCKH.



Bùi Huy Hùng

**PHỤ BIỂU 07: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

Dự án: Đường giao thông từ QL 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bim Sơn

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bim Sơn

Địa điểm thực hiện: thuộc phường Bắc Sơn, Ba Đình, Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng mức đầu tư: 181.086.000.000 đồng


Tổng dự toán: 181.086.000.000 đồng

Kế hoạch vốn trong năm của dự án: 30.000.000.000 đ

Lũy kế kế hoạch vốn cho dự án: 79.547.000.000 đ

TT	Tên hạng mục/Gói thầu	Giá trị (triệu đồng)	Nguồn vốn	Tiến độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện (triệu đồng)	Lũy kế giải ngân (triệu đồng)	Thất thoát, lãng phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú
					Giá trị thực hiện (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)					
<b>I</b>	<b>Bước lập dự án:</b>		- Vốn ngân sách tỉnh; - Vốn huy động hợp pháp của thị								
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập dự án	1.639,085		Đảm bảo			1.379,948	1.241		Đã hoàn thành	
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu gói thầu	45,114		nt			45,114	45,114		nt	

	khảo sát, lập dự án đầu tư								
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)	276,339			274,467	249,700		nt	
<b>II</b>	<b>Bước</b> <b>TKBVTC</b>								
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB	2.052,589			1.862,621	1.676,358		Đã hoàn thành	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu xây lắp, tư vấn	355,032			219,563	197,606		nt	
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	163,656			163,656	163,656		nt	
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng công	237,673			237,673	237,673		Theo tiến độ thi công	

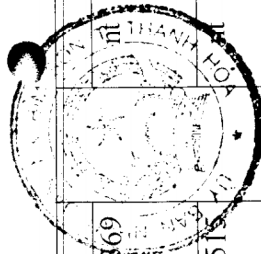

5	trình Gói thầu số 05: Giám sát đánh giá dự án	369				290	290	nt
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.748,515	350,000	0	1.370,350	854,081	nt	
7	Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn	561,421			561,421	505,278	Đã hoàn thành	
8	Gói thầu số 08: Xây dựng công trình	133.142,842	41.300	27.000	124.000	54.093,460	Tháng 8/2017	
9	Gói thầu số 09: Thăm tra ATGT	65			Không thực hiện			
10	Gói thầu số 10: Giám sát môi trường	102,814			Theo tiến độ thi công	20,562	Tháng 8/2017	
11	Gói thầu số 11: Chi phí kiểm toán	416						
12	Gói thầu số 12: Tư vấn lập TKB/TC-DT hạng mục điện chiếu sáng	339	341		341		Đã hoàn thành	
13	Gói thầu số 13: Tư vấn thăm tra	56	56		56		Đã hoàn thành	

	TKBVTC-DT hạng mục điện chiếu sáng																		
14	Gói thầu số 14: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng.	58	nt	58	58														Tháng 8/2018
15	Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng	378																	
16	Gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng	16.864																	
